

සැලසුම් කිරීම හා වැඩ සටහන් සකස් කිරීම

බලිලිව. ගුණසේගරම

මහවැලි සංවර්ධන මණ්ඩලය

මහවැලි සංවර්ධන ව්‍යාපාරය කඩිනම කිරීම යනුවෙන් කුමක් අදහස් වේද?

මුදල් යෙදවීමේ හා ඉදිකිරීමේ වැඩ සටහන් ආදිය අනුපිළිවෙලින් ක්‍රියාත්මක නොකොට, ව්‍යාපාරය හා අදාළ වූ ප්‍රධාන යෝජනා ක්‍රම සමකාලීනව ක්‍රියාත්මක කරවීම සඳහා රජය විසින් ගන්නා ලද තීරණය මහවැලි සංවර්ධන ව්‍යාපාරය කඩිනම කිරීම යනුවෙන් අදහස් වේ. මේ සඳහා මිනිසුන්, මුදල්, යන්ත්‍රෝපකරණ, ද්‍රව්‍ය ආදී වූ සම්පත් රාශියක් සංකේන්ද්‍රණය කර කෙටි කාලසීමාවක් ඇතුළත ප්‍රයෝජනය සඳහා ලබාගැනීමට සැලසිය යුතුය. වැඩ අවශ්‍යතා සහ මෙසා මහත් කාර්ය සංකීර්ණයේ කළමනාකරණ අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා සම්පත් තත්ත්වය ප්‍රමාණවත් විය යුතුය.

මුදල් යෙදවුම.

මහවැලි සංවර්ධන ව්‍යාපාරය ඔවුන්ගේ ආධාර හා මුදල් යෙදවුම් ආයෝජනය කිරීම සඳහා යෝග්‍යවූවක් බව ජනාධිපතිවරයා, වාරිමාර්ග හා මහාමාර්ග ඇමතිවරයා හා මුදල් හා ක්‍රම සම්පාදන ඇමතිවරයා විසින් අප ජාතියට, ලෝක බැංකුවට හා සංවර්ධිත රටවලටද ඒත්තු ගන්වා ඇත. රුපියල් කෝටි 1200 ක ආධාර ලබාගැනීම පිළිබඳව සැක පහළ කළ බොහෝ අය සිටින නමුත් එහි සාවද්‍යතාවය දැනටමත් ඔප්පු වී ඇත.

මුදල්, කෘෂි-ප්‍රතිලාභ, සමාජීය ප්‍රතිලාභ, රැකියා නියුක්ති ප්‍රතිලාභ, ජල ඉල්ලුම හා සැපයුම, මිල ප්‍රතිලාභ යනාදී මූලික පරාමිති සලකාබැලීමෙන් ඉදිකිරීමේ අනුපිළිවෙල විභාග කළ හැක. නියමිතාල අන්‍යෝන්‍ය රැඳී පැවැත්මෙන් යුතුය; සංකීර්ණය, කොටින්ම, මුදල් යෙදවුම හා සම්පත් ලබාගත හැකිබව පිළිබඳ නියමිත කාලයන් කොතරම් විචල්‍යය ද හා දැනට ශ්‍රී ලංකාණ්ඩුවේ පාලනයෙන් කොතරම් පිටස්තර ද කිවහොත් මාගේ මතය අනුව, අනුක්‍රමණය කිරීම, යුක්ති ප්‍රතිපාදනය කිරීම නිෂ්චල වනු ඇත. කොත්මලේ වික්ටෝරියා, රන්දෙනිගල හා මොරගහකන්ද බදු වූ ප්‍රධාන ජලාශ්‍ර ඉදිකිරීම අනුක්‍රමණය කිරීම මුදල් යෙදවුම් අනුක්‍රමණය කිරීම හා අනුකූල වනු ඇත.

මිනිසේ දකුණු ඉවුරු ඇළ, උල්තිටිය ජලාශය, මාදුරු ඔය, මිනිසේ හා කන්දෙකාඩු අමුණු හා ඒ, බී, සී, යන වාරි කර්මාන්ත කලාප ආදිය ඉදිකිරීම, ප්‍රධාන ඉදිකිරීම් කටයුතු නිමකිරීම අනුක්‍රමණය කිරීමට පසුව කළ යුතුය. දයක රටවල වැඩ සටහන් ක්‍රියාත්මක කරවීමෙන් පසුව හා ඔවුන්ගේ කොන්ත්‍රාත්කරුවන් පැමිණියාට පසුව මිළහ මාස කිහිපය ඇතුළත අනුක්‍රම පිළිවෙල පැහැදිලි විය යුතුය.

ඉදිකිරීම.

මෙරට යන්ත්‍රෝපකරණ, ද්‍රව්‍ය හා කළමනාකරණ යනාදී වූ ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය සම්පත්වලින් එකද ක්ෂේත්‍රයකවත්

සය අවුරුදු කාලසීමාවක අවශ්‍යතා සපුරාලිය නොහේ. දයක රටවල් විසින් ජාතික කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලවා ඔවුන්ගේම සම්පත් යෙදවීමට සැලැස්වීමෙන් මෙම බාධක මහඟු ලෙස ගෙන ඇත.

ප්‍රධාන ඉදිකිරීම් වැඩ පහත දක්වා ඇති අන්දමට සංක්ෂිප්තව දැක්විය හැක:—

1. වේලි, ජලාශ හා මා වැඩ - වඩා යන්ත්‍ර සුදුසු භාවිතයෙන්
2. බල මධ්‍යස්ථාන
3. වාරි කර්මාන්ත පද්ධතීන් - වඩා ශ්‍රමය භාවිතයෙන්

මෙයින් මුලින් සඳහන් කටයුතු විදේශීය කොන්ත්‍රාත්කරුවන් විසින් ඉටුකරනු ලැබිය යුතුය. වාරි කර්මාන්ත කටයුතු, දේශීය තත්ත්වයන් ගැන වඩා හොඳින් දන්නා ශ්‍රී ලාංකිකයන් විසින් ඉටුකරනු ලැබීම වඩා උචිතය.

වාරි කර්මාන්ත අධ්‍යයන ව්‍යුහය.

වාරි කර්මාන්ත පද්ධතියේ සැලැස්ම හා එය ඉදිකිරීම, ජල යක්ති හා ඉංජිනේරු අවශ්‍යතාවයන් සමඟ පමණක් නොව බෝග ඉල්ලුම, වගා රටාවන්, ජල පරිමාව හා වගා කිරීමේ කාල පරිච්ඡේදයන් සමඟද අනුකූල විය යුතුය.

ගොවින් පදිංචි කරවීම.

ජනාවාසීන් තෝරාගැනීම, ඔවුන් පදිංචි කරවනු ලබන ප්‍රදේශවල වගාකළ හැකි බෝගවලට අනුහුරුවීම ඔවුන්ගේ යෝග්‍යතාවය මත රඳා පවතිනු ඇත.

කෙසේ වුවත්, ගොවි කණ්ඩායම්වලට මාරුවෙන් මාරුවට ජලසම්පාදනය කිරීමේ ක්‍රමය පිළිබඳව පුහුණුවක් ලබාදීම සඳහා ගොවි අභ්‍යාස වැඩසටහන් පැවැත්වීමට නියමිතය. විශේෂවගොවින් සඳහා නියම කර ඇති ඉඩම්වල ජනාවාසීන් පදිංචි කරවීමට මත් තෙත්, ඔවුන්ට හුරු පුරුදු නැති බෝග වගාකිරීම පිළිබඳව පුහුණු වක් ලබාදීමට යෝජනා කර ඇත.

කෘෂිකර්මාන්තය.

ලබාගත හැකි ජල සම්පතෙහි ප්‍රශස්ත උපයෝගීතාවය, මහවැලි සංවර්ධන යෝජනා ක්‍රමයේ වැදගත් අංගයකි. ව්‍යාපාරය නිර්මාණය කර ඇත්තේද, යෝග්‍ය පසෙහි (දිය ගැල්වීමේ පරිමාණය අඩු) වී හා සාම්ප්‍රදායික ලෙස ලියදී පිරවීමෙන් විවහාකිරීමේ ක්‍රමයට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් ජලය අවශ්‍ය වෙනත් බෝගද සංකලනය වූ වැටිලි ක්‍රමයක් සඳහාය.

ඕනෑම පස් වර්ගයක සියළුම කන්තවලදී ලියදී පිරවීමේ ක්‍රමයට වී වගාකිරීමේ පුරුද්දෙන් ගොවීන් මැත් කරවීමේ ප්‍රශ්නය තවමත් සාර්ථකව විසඳිය යුතුව ඇත. යල කන්තයේදී ලියදී පිරවීමේ ක්‍රමය අනුව සිමිත වී වගාව සහිතව කලින් නියම කළ ජල පරිමාවක් මත ජලය සැපයීම සඳහා ජලාශ ධාරිතාවයන් හා ඇල මාර්ග පද්ධතීන්ද සැලසුම්කර ඇති බැවින් මෙම ප්‍රශ්නය විසඳිය යුතුව ඇත.

ප්‍රජා සංවර්ධනය (හා සමාජීය අධ්‍යයන ව්‍යුහය).

ප්‍රජා සංවර්ධනය කෘෂිකර්මාන්තය හා ගොවීන් පදිංචිකරවීම අභිබවා සිටියද, එකී කාර්යයන් දෙකම ප්‍රජා සංවර්ධනයෙහි අන්තර්ගත වේ. මාර්ග, ප්‍රවාහණය, නිවාස, පණිවුඩ හුවමාරු ක්‍රම, සැපයුම් හා කෘෂිකර්මාන්තය, අලෙවිය හා බෙදාහැරීම සඳහා අවශ්‍ය යෙදවුම් හා සේවා සැපයුම් සැලසුම්කිරීම බොහෝ කල් වෙලා ඇතිව ආරම්භ කළ යුතුය. මෙම කාර්ය සැලසුම් කිරීම හා එය කොටස් වශයෙන් හෝ ක්‍රියාත්මක කර තිබීමද, ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කිරීමට මත්තෙන් කළ යුතු බව පැහැදිලි කරුණකි.

ප්‍රජා සංවර්ධනය හා සමාජීය අධ්‍යයන ව්‍යුහය සියලු කාර්ය හා සම්බන්ධවූ, වාරි කර්මාන්ත පද්ධතීන්හි මුල් අවධිත් හා කෙලින්ම බැඳී පවත්නා කටයුත්තක් ලෙස මා දැක්වූයේද මේ නිසාය. ('ප්‍රධාන කටයුතු' බලන්න).

වැඩසටහන් පිළියෙල කිරීම, වාර්තා කිරීම හා අගයුම් කිරීම.

තාත්වික ඉලක්ක දින නියම කරගැනීමේ අදහසින් ඵෙතිහාසික


මෙන්ම තරා දත්තයන් අනුසාරයෙන් වැඩසටහන් සකස්කිරීම ප්‍රවර්ධනය කොට ඇත. සෑම ප්‍රධාන කටයුත්තක්ම සඳහා ජාලයක් සකස්කරන ලදුව, ඒවායේ අන්තර් සම්බන්ධතා හා අන්‍යෝන්‍ය රැඳීයාවන්ද සකස්කර ඇත. වාරිමාර්ග පද්ධතීන් ඉදිකිරීම, ජනාවාස කෘෂිකර්මාන්තය හා සංවර්ධනය ආදී කටයුතු සමායෝජනය කරනු ලබන්නේ මහවැලි සංවර්ධන මණ්ඩලය මගිනි.

වාර්තා කිරීම.

දෘෂ්‍යමාන වාර්තා කිරීම් ක්‍රමයක් සකස් කොට ඇති අතර මහවැලි සංවර්ධන මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂකවරුන්ට හා අනිකුත් අයටද, පිටස්තර පුද්ගලයන්ටද මෙම ක්‍රමය අනුව කාර්ය ප්‍රගතිය පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබාගැනීමට පහසුවීම් දිරිගන්වන සුළු කරුණකි. සාමාන්‍ය අන්දමට සංඛ්‍යා භාවිතයෙන් මෙම නිරූපනය පරිපූරණ කෙරේ.

ඇගයුම් කිරීම.

මේවනවිටත් සංවර්ධනය කරනු ලබන 'එච්' කලාපයේ හා කඩිනම් වැඩසටහනෙහිද ප්‍රගතිය පිළිබඳ සරල ඇගයුමක් දැනට කරනු ලැබේ. සංවර්ධිත ප්‍රදේශවල ප්‍රතිලාභ ඇගයුම් කිරීමේ අදහසින් හා අරමුණු ආශ්‍රයෙන් ප්‍රතිඵල සමාලෝචනය කිරීමද උදෙසා ක්‍රම සම්පාදන හා ඇගයුම් අංශය ව්‍යාප්ති කරනු ලැබේ. ප්‍රවීණ දේශීය හා විදේශීය විශේෂ උපදේශකවරු මෙම විචක්ෂණක සංවර්ධන ව්‍යායාමය සැලසුම් කිරීමෙහි නියුතුව සිටිති. මෙම කාර්යය හා සම්බන්ධ සෑම පුද්ගලයෙකුම මුළු ලොව පුරා විස්තීර්ණව ඇති මෙම කටයුතු දමයෙහි එක් කුඩා පුරුකක් පමණක් වන බව නොකිවමනාය.



යෝජනා ක්‍රමයේ සාර්ථකත්වය සැලසුම් කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම

_____කාලය_____>

දේශපාලනමය හා ආර්ථික ප්‍රාථමික

දේශපාලනමය හැඳීම, ආර්ථික හා සාමාජික බලපෑම

සාධාරණ අධ්‍යයන

මහා සැලැස්ම (ප්‍රථම සිසිලි/වර්ෂ ජීවිත දත්ත, යෙදවුම් - නිපැයුම් වල විශ්ලේෂණය, ක්‍රමය, පිරිමැසීම, ආපසු ලැබීම)

මුළු ආර්ථික හා මූල්‍යමය කිරීම

(අයවැය, රැකියා නියුක්තිය, සමාජීය ප්‍රතිලාභ ආදිය)

තෝරාගත් යෝජනා ක්‍රම අධ්‍යයනය

මූල්‍ය යෙදවුම් (දේශීය හා විදේශීය)


ඉදිකිරීම (දේශීය හා විදේශීය ඒජන්සි)

1969

- _____ජනාවාස
- _____කෘෂිකර්මය හා
- _____විදුලි ය පනත
- _____සංවර්ධනය
- _____ප්‍රතිලාභ
- _____ආගමුම

2 වන පරිච්ඡේදය

කාලය →

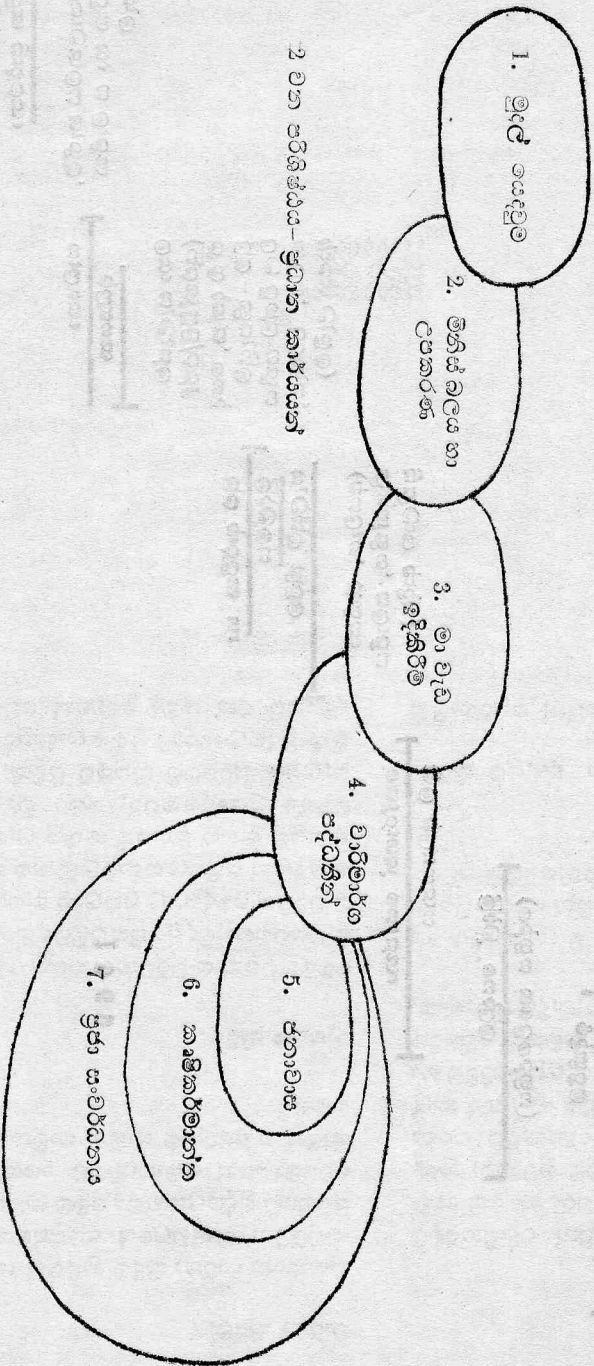

2 වන පරිච්ඡේදය - ප්‍රධාන කාර්යයන්

3 වන පරිච්ඡේදය
1977-1983

කාල පරිච්ඡේදය →

1977

දේශපාලනමය හා සමාජීය වගකීම

1983

